CRONOPROGRAMMA INTERVENTI - Mesi da 25 a 36

INTERVENTI 2a FASE

SOTTOFASE 2.1

SOTTOFASE 2.2

SOTTOFASE 2.3

Nome Attività	Durata
Allest. Interv. Area Esterna Ovest	45 g
Recinzione e Accesso Cant. Area Es. Ov.	14 g
Impianti di servizio cant. Area Es. Ov.	22 g
Impianto elettrico cant. Area Es. Ov.	7 g
Sistemazione Aree Esterne - A Ov.	90 g
Realizzazione Aree Pedonabili	60 g
Realizzazione Percorsi Pedonabili	60 g
Smobilizzo cantiere interv.area es. Ov.	30 g
Pulizia generale dell'area del cantiere	7 g
Smobilizzo del cantiere	30 g
Allest. Interv. Recinzione esterna gen.	30 g
Recinzione e Accesso Cant. Aree est.	15 g
Impianti di servizio cant. Aree est.	22 g
Recinzione esterna generale	30 g
Recinzione di confine Nord-Ovest	14 g
Recinzione di confine Sud-Ovest	14 g
Smobilizzo cantiere interv.area es. Ov.	63 g
Pulizia generale dell'area del cantiere	42 g
Smobilizzo del cantiere	42 g
Allestimento Cantiere Compl. Parcheg.	21 g
Recinzione e Accesso Cantiere Comp. Parc.	49 g
Impianti di servizio cantiere Comp. Parc.	35 g
Impianto elettrico cantiere Strad.+Parc.	42 g
Interventi Uso Esclusivo Area	21 g
Realizzazione compl. 1/2 Area di Parcamento	21 g
Smobilizzo cantiere interv.esc.area	15 g
Pulizia generale dell'area del cantiere	7 g
Smobilizzo del cantiere	7 g

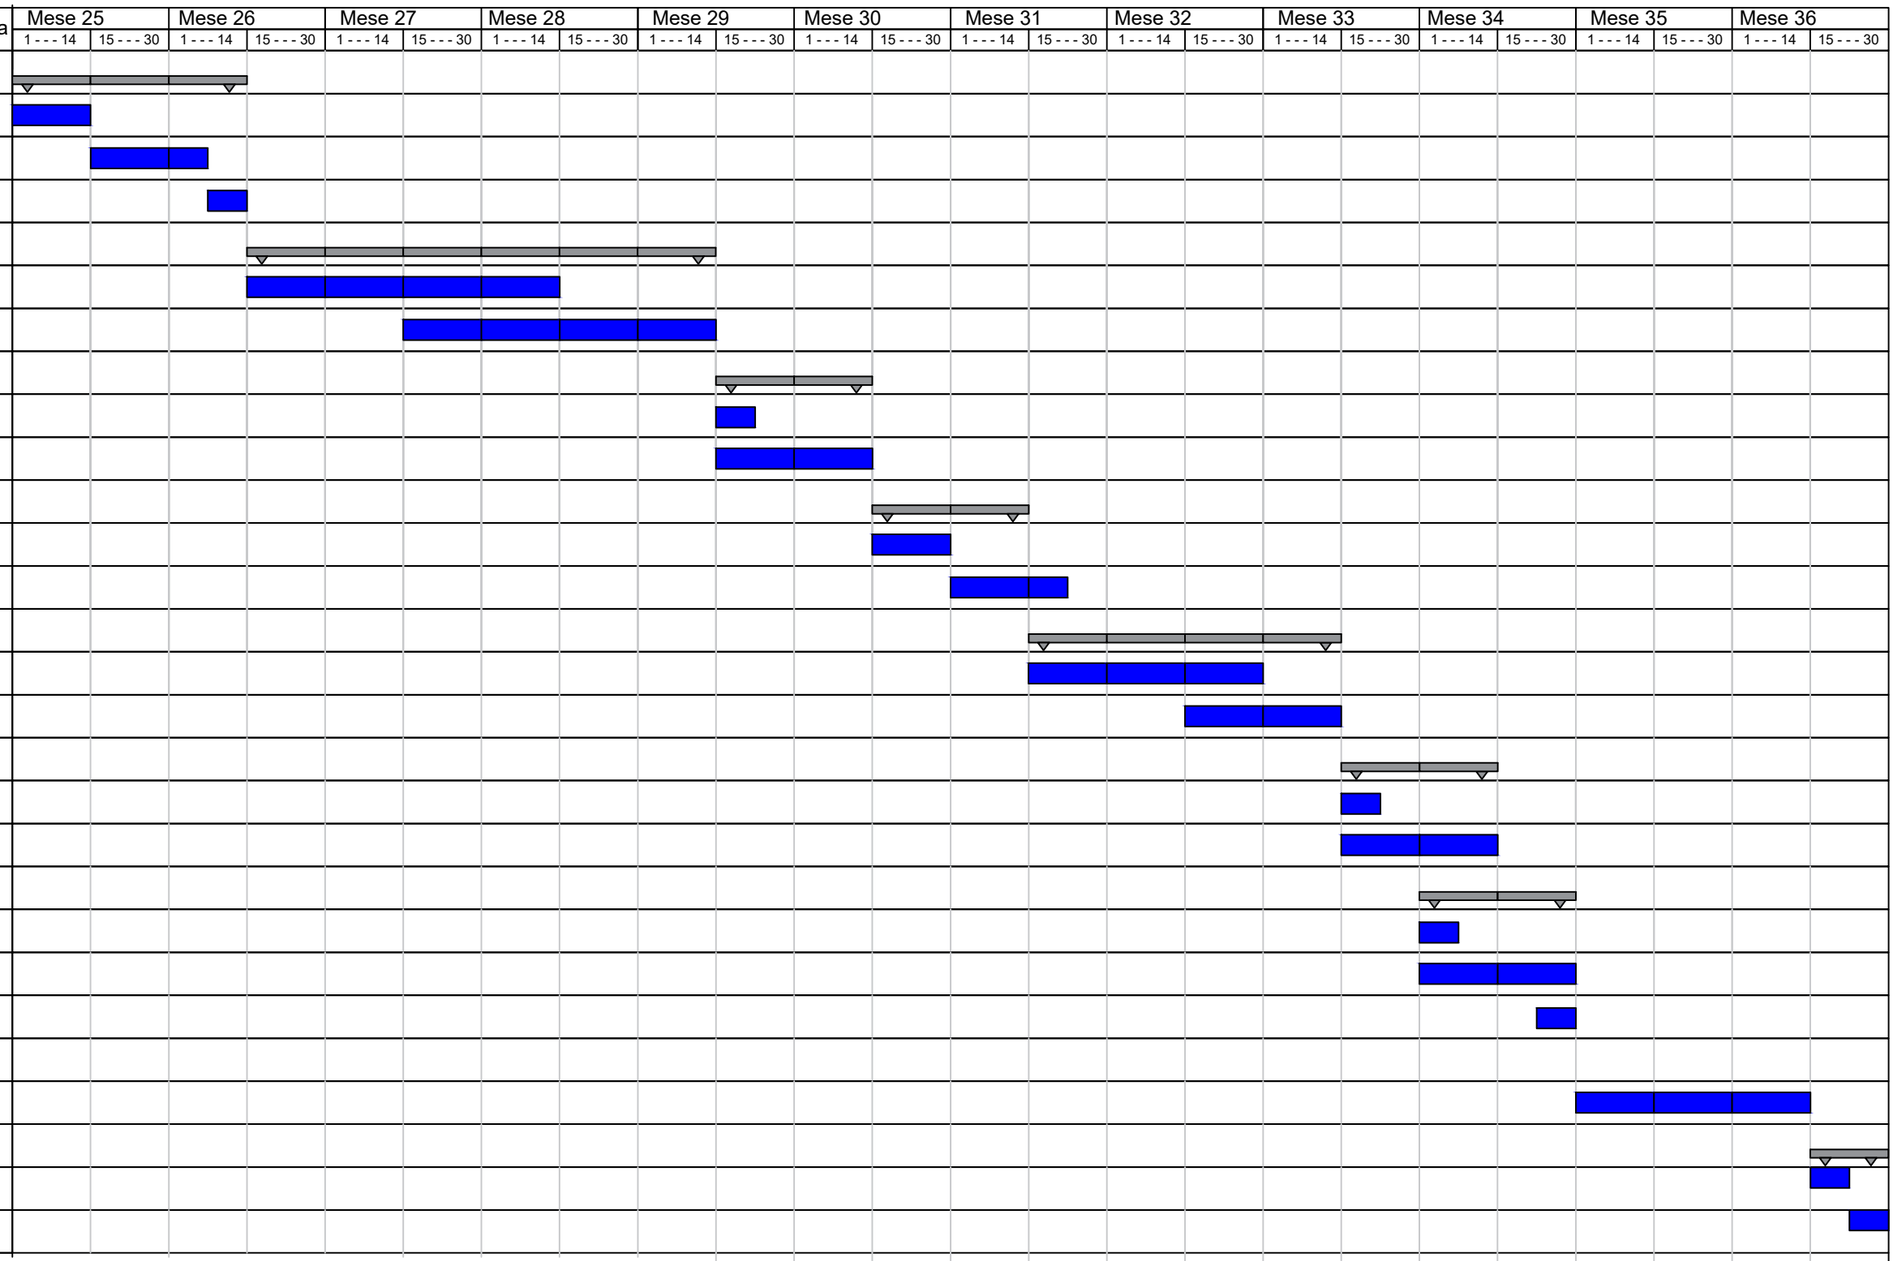

COMPLETAMENTO INTERVENTI 2a FASE E DEGLI INTERVENTI COMPLESSIVI
